作業計画書：カンツギ事業計画書の仕上げ（10/13〜10/22）

Oct 11, 2026 · @seitoshiki

目的と成果物

7日間・計21時間で、事業計画書（株式会社カンツギ）と付属資料を完成させ、Oct 22, 2026 15:00 までに提出する。提出物は14:30に固め、30分を予備に残す。

成果物	中身	形式
事業計画書（本編）	発表用の33枚（日立グループとの違い、10年の試算、創業者の願いを追加）。課題の設問①〜⑤の順（①事業・理由・想い ②スタッフ ③経営理念 ④年単位の計画と収支 ⑤段階ごとの課題）に並べ、右上に計算詳細版のページを書く。導入効果（1拠点10台で年約500万円、元が取れるのは1台1日23分）・端末と使い方（普段使いのAIグラス）・競合（RealWear等を追加）・資金（自己資金 約2.55億円）・黒字化の条件（1拠点15台）・実現可能性の見直し	pptx・pdf
やさしい版	マンガで、ストーリーとお金の流れ（300万円・216万円・約4拠点）、元が取れる条件（1台1日23分）、黒字化の条件（1拠点15台）と止まる線を説明する18枚	pptx・pdf
計算詳細版（質問用）	本編の数字の計算過程をまとめた32枚（10年の延長を追加）。人件費（×1.17÷1,938時間）・削減時間・元が取れる条件・値段の内訳・端末の台数・AI費用と粗利率・導入支援・解約・売上・チーム・収支・損益分岐点・LTV/CAC・ストレステスト・撤退ライン・資金計画・市場・ターゲット・グラスの条件と実証・データ基盤・場面の選び方とAIの学習・グラスの持ち方（リースの3段階）・厳しい質問・出典	pptx・pdf
説明台本・想定問答	15秒〜3分の台本（本編で言うことと、詳細版のどのページで答えるか）、Q1〜63	md
デモアプリ	架空のケーブル接続工事で、図面との差異検出と自動報告を見せる	Web
ロゴ	ARスキャン・キューブ＋金継ぎの継ぎ目とロゴタイプ（KANTSUGI／カンツギ｜勘継）	svg・png

着手前の状況（10/9）

10/9 9:30〜11:30に課題の提示を受け、事業計画書の下書きに着手した。初版に加えて、その後に出た追加案も下書きとして手元にある。10/13からは、これらを自分で確かめて採否を決め、自分の言葉で話せる状態にする。


区分	下書きの内容	期間中の扱い
初版	デザインの土台（白黒＋銅色）、事業構想と社名案、事業計画書の本編、デモアプリ	内容を確かめ、自分の言葉に直す
初版	計算モデル、やさしい版（マンガ）、理論武装版、説明台本	前提を確かめ、数字を10/16に固める
追加案	市場規模のフェルミ推定、GTMの点検、最初の顧客を「関東の中堅電気工事会社」にする案	10/13に採否を決め、10/14に確かめる
追加案	社名を「カンツギ（勘継）」とする案と、ロゴの作り直し案（ARスキャン・キューブ＋金継ぎの継ぎ目）	10/13に採否を決める
追加案	背景・手元AR・育つAI・端末戦略のスライド案	10/13に採否を決め、10/15に確かめる

作業時間の総量と配分

使える時間は7日・11コマの時間帯で計21時間。いちばん重いのは、計算の前提を確かめる「収益モデルと収支」と、3種の資料の数字を合わせる「資料の組み立て」。

21時間のうち8時間を数字と資料に充てる

工程別の作業時間（時間、合計21時間、うち数字と資料 8時間＝38%）

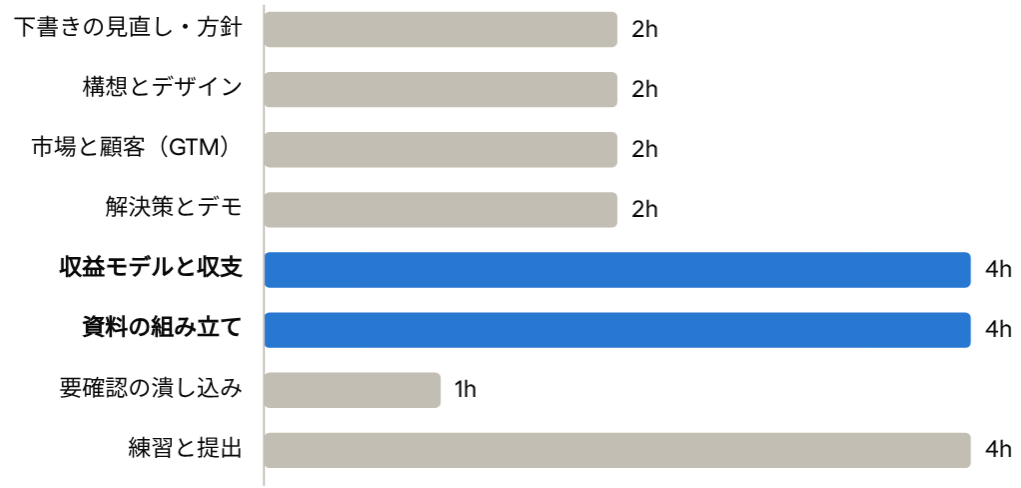

上から作業の順。数字は10/16、資料は10/19に固める

作業時間帯（7日・11コマ）から配分

練習と提出にも最終日の4時間を丸ごと充て、当日に新しい作業を入れない。

日別の作業計画表

11の時間帯を、下書きの見直し → 構想 → 市場 → 解決策 → 数字 → 資料 → 確認 → 話す練習の順に使う。数字は10/16、資料は10/19で固め、10/22は確認と練習だけにする。


日時	時間	作業内容	成果物	完了の条件
10/13（火）9:30〜11:30	2h	下書きの見直しと方針の確定：初版と追加案を読み、最初の顧客（電気工事・中堅）、ロゴ、AR・端末の構成の採否を決める	採否の一覧・スライドの目次	追加案の採否がすべて決まっている
10/13（火）13:00〜15:00	2h	構想とデザインの確認：背景（AIは事務作業から作業者の支援へ）、課題、谷本氏の①〜⑦の構成、スライドの型と採用したロゴ	構想メモ・スライドの型	事業を一文で、ロゴの意味を30秒で言える

日時	時間	作業内容	成果物	完了の条件
10/14（水）13:00〜15:00	2h	市場と顧客：市場規模の原典、業種×規模のフェルミ推定、セグメント評価、GTM（WHAT・WHO・WHY・HOW）	市場規模の計算・理想の顧客像	最初の顧客を選んだ理由を4つの物差しで言える
10/15（木）13:00〜15:00	2h	解決策：手元AR・育つAI・端末戦略・競合（施工管理アプリ）、デモアプリの確認	解決策のスライド・デモ	デモを3分で見せられる
10/16（金）9:30〜11:30	2h	導入効果と収益モデルの見直し：1時間の人件費（統計の年収と総労働時間）、端末を着けた班だけの削減時間、手戻りと新人指導の扱い、値段の内訳と端末の台数、AI費用と粗利率、導入支援・解約・チーム体制を前提から問い直す	見直し案（前提と懸念の整理）	見直し案の数字（得÷費用1.4倍、元が取れる1台1日26分、粗利率72%）を根拠つきで説明できる
10/16（金）13:00〜15:00	2h	収支と方針の決定：見直し案を採り、本編・やさしい版を新しい数字に直す。計算の過程は計算詳細版（質問用）にまとめ、本編と二段構えにする。追加の見直し（AIグラス化・コンサル部隊の内製・自己資金・競合にRealWear等・本編を設問①〜⑤の順に）も反映した	5年収支・資金繰り	**数字を固める**（この後は変えない）
10/19（月）9:30〜11:30	2h	本編の組み立て：33枚の通し確認、ノート原稿、出典、チーム欄の記入	本編（pptx・pdf）	全スライドに「一つのメッセージ」がある
10/19（月）13:00〜15:00	2h	付属資料：やさしい版・計算詳細版・説明台本・想定問答を本編と数字合わせ	付属資料一式	**資料を固める**（3種の数字が一致）

日時	時間	作業内容	成果物	完了の条件
10/20（火）10:30〜11:30	1h	要確認の潰し込み：原典（65,497社・規模の比率）、賃金の令和6年値、グラスの国内の正規販売・技適・保護めがねの規格・録画と電池の制約、リース料率とレンタル料、クラウドの単価、前職との関係	確認リスト	未確認は「仮定」と書かれている
10/22（木）9:30〜11:30	2h	通し練習：台本は約15分50秒（33枚）。持ち時間に合わせて削る。想定問答で受け答え	削った発表順・録音	時間内に話せる、棒読みでない
10/22（木）13:00〜15:00	2h	最終修正と提出：誤字・数字の最終確認、PDF化、**14:30に提出**	提出物一式	15:00 までに提出済み

マイルストーンとリスク対策

関門は2つ。数字は10/16、15:00、資料は10/19、15:00で固め、その後は前の工程に戻らない。

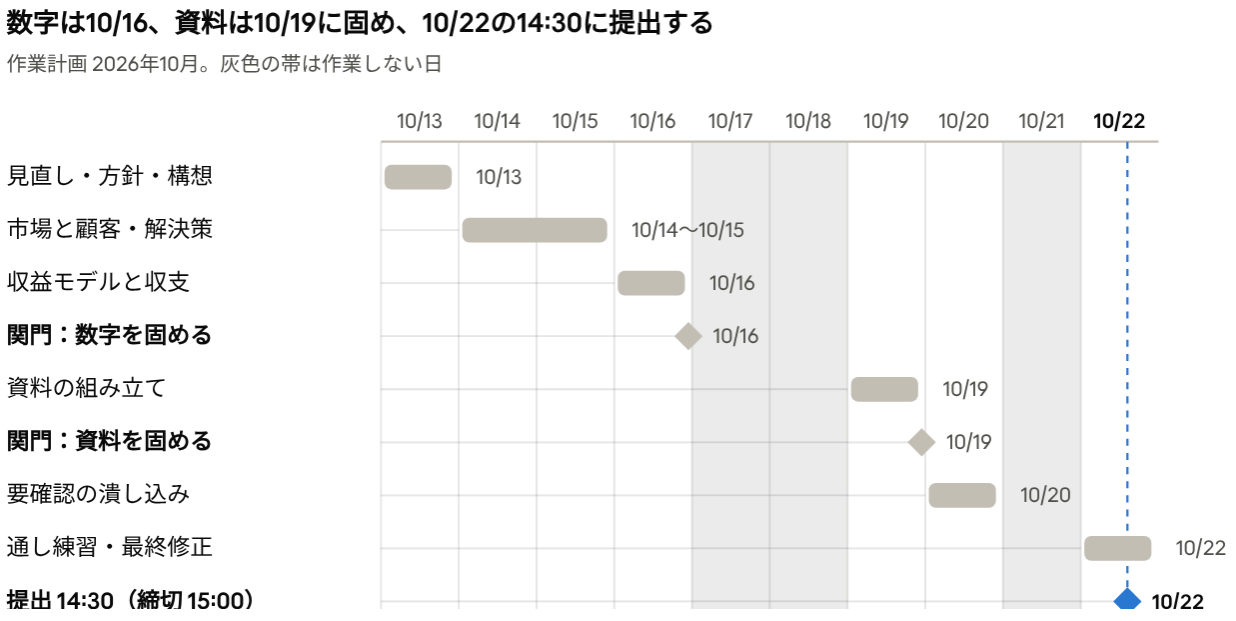

日別の作業計画表から · 10/13〜10/22

リスク	兆候	対策
数字が10/16に固まらない	前提の確認が終わらない	未確認の前提は「仮定」と書いて固める。10/20の1時間で差し替える
資料の数字が食い違う	3種の資料で売上・拠点数が合わない	数字は計算モデル1本から出す。手で書き換えない
見直しで数字が大きく変わる	お客様の得÷費用が3倍に届かない	確かめていない4,200万円は使わない。合格ライン（1台1日23分）を実証の目標に置き、計算の過程は計算詳細版で示す。10台のままでは5年で黒字にならないことも隠さず、黒字化の条件（1拠点15台）として示す
発表が時間内に収まらない	通し練習で約15分50秒	背景・育つAI・端末の3枚はノートに回し、質問されたら見せる
体調で作業が止まる	予定の時間帯に着手できない	削る順番を先に決める：やさしい版の仕上げ → 理論武装版の仕上げ。本編と提出は削らない
提出直前のトラブル	PDF化やファイルの不具合	14:30に提出し、30分を予備にする。前日までにPDFも作っておく
